

Conforme a lo dispuesto en la Ley 951 de 2005 los servidores públicos que administren fondos o bienes del Estado tienen la obligación de presentar al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. El acta de informe de gestión deberá contener como mínimo la información requerida en el artículo 10 de la citada ley.

1. INFORMACIÓN GENERAL SERVIDOR (A)					
Nombre y Apellido de quien entrega el cargo: Isabel Arcos Zuluaga					
Denominación del Empleo:	Subgerente	Código:	090	Grado:	02
Ubicación: Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamiento – INDEPORTES Antioquia					
Motivo de la Entrega:					
Marque con una X la casilla que corresponda					
Retiro:	<input checked="" type="checkbox"/>	Licencia:	<input type="checkbox"/>	Comisión:	<input type="checkbox"/>
Personal a cargo:					
Marque con una X la casilla que corresponda					
Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
Fecha de entrega: (dd/mm/aaaa): 08-10-2024					
Dirección y ciudad de Residencia: Calle 37 sur #27-90					
Teléfonos de Contacto: 316 3681381					
Correo (s) electrónico (s): isaarcos@gmail.com					

INFORME DE GESTIÓN
(Utilice conceptos y vocabularios claros y sencillos, en caso de presentar información estadística, incluya el título y la fuente de la información)
1. Descripción resumida de la situación del Despacho o cargo a la fecha de inicio de su gestión:
El 1ro de abril del presente año, inicio labores como Subgerente de Escenarios Deportivos y Equipamientos, mediante el Acta N°15 y de acuerdo con lo ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política y lo establecido en la Ley 4 de 1992.
Cabe mencionar, que no recibí empalme alguno de temas, procesos o personal a cargo por parte de la funcionaria que se encontraba en encargo de las funciones. La cual presentó un informe de gestión extemporáneo e incompleto.
Por medios propios, se identificaron los procesos que hacían parte de la Subgerencia los cuales constituyeron: Controversias contractuales, liquidaciones, proyectos en ejecución de la vigencia 2023, Central Park, Ciclo-infraestructura de Oriente y Occidente, situación predial del proyecto ciclo-infraestructura, mesas técnicas con VIVA, pendiente cierre técnico y financiero de proyectos contratados con el Ministerio del Deporte y todo lo relacionado con el planteamiento y definición de metas e indicadores del Plan de Desarrollo 2024-2027. Posteriormente, se trazaron metas para cada uno de los proyectos de las diferentes vigencias de acuerdo a lo pendiente por gestionar y se evidenció la hoja de ruta para los indicadores que se determinan para la Subgerencia y las actividades a desarrollar en el marco de las mismas.
2. Informe resumido por escrito de la gestión del servidor público saliente:
Las siguientes actividades y proyectos, hacen parte de la gestión y avances trazados como meta de manera general de acuerdo a la Hoja de Ruta que constituye el Plan de Desarrollo Departamental "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027" en el marco de la misionalidad de la Subgerencia, que tuve a cargo durante mi desempeño:
-Liquidaciones:
Proceso de convocatoria de liquidación bilateral a los municipios, para lo cual se tiene un modelo de oficio con



el listado requerido y necesario para dar inicio a este proceso.
(Archivo soporte en sharepoint, oficios enviados por mercurio por lo cual se tiene la trazabilidad del mismo y proceso articulado con la profesional especializada y el apoyo financiero de la subgerencia).

Continuar con la liquidación unilateral para los municipios que no dieron respuesta a la convocatoria y revisar las actas de liquidación que se tienen proyectadas.
(Información que reposa en el sharepoint en el cuadro matriz y del cual tiene manejo el apoyo financiero de la subgerencia).

-Proyectos 2023 en curso:

Seguimiento a los municipios pendientes de terminación de obra y entrega de la misma, realizar visita final para corroborar la correcta ejecución de los recursos de cofinanciación de Indeportes Antioquia y solicitar la información a los municipios, para cierre de los convenios.
(cada supervisor es responsable de efectuar el seguimiento a los convenios y debe generar un informe de supervisión del estado de los mismos, de igual manera tiene la responsabilidad a su haber de tener al día toda la información relacionada con el convenio).


-Seguimiento a los municipios que actualmente tienen los convenios suspendidos, solicitar al supervisor el informe de seguimiento y la identificación del avance en las causas que generaron la suspensión y los compromisos adquiridos, para proceder a efectuar incumplimientos si así se requiere, o proceder con la solicitud de las garantías y soportes para su reinicio.

A la fecha, la dependencia cuenta con 62 proyectos a cargo, de los cuales se encuentran; 16 convenios suspendidos, 5 en ejecución y 41 terminados.

-Ministerio del Deporte:

Concluir el proceso de cierre documental técnico y financiero con los convenios efectuados con el Ministerio del Deporte, se tiene como insumo información financiera analizada, efectuada por medio de archivos de Excel y presentaciones de análisis de la situación contractual desarrollada. También se tienen informes de las visitas técnicas realizadas a cada uno de los escenarios pendientes por recibir; siendo estos: Guadalupe, Santo Domingo, Toledo y Frontino.

(Información disponible en el sharepoint, compartida con el área jurídica y la Gerencia Indeportes, proceso técnico y financiero apoyado por el "equipo élite").

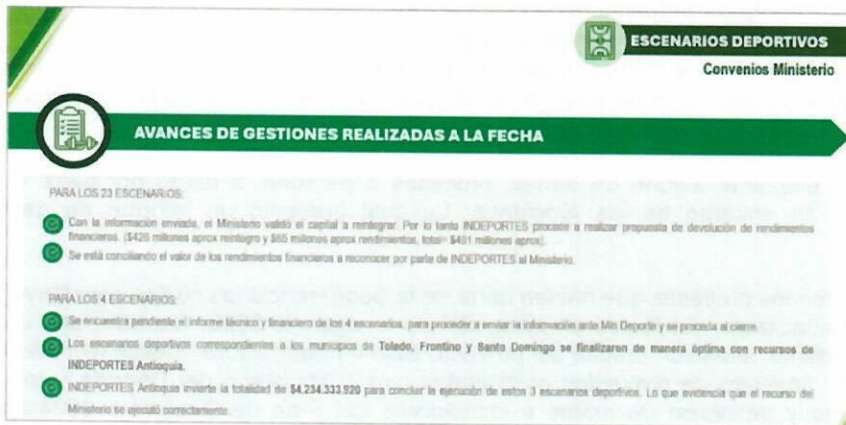

-Proyecto Parque Metropolitano Tulio Ospina - Central Park:

En el año 2022, desde INDEPORTES por medio del Comité de expertos y Obras inconclusas se determinó un presupuesto estimado de \$54.420.800.843 sin contar A.U. e Interventoría, para finalizar la etapa actual y la puesta en funcionamiento del Central Park.

Contrato 553 de 2022, por medio del cual se ejecuta la etapa actual se encuentra suspendido en espera de permisos de temas eléctricos e hidrosanitarios y permiso de aprovechamiento forestal.

Una vez se finalice la ejecución de la etapa actual se deberá proceder a evaluar lo ejecutado en obra y lo presupuestado contractualmente; logrando así establecer un valor aproximado de las obras faltantes y que

estaban contempladas en los diseños iniciales.

Se avanzó con la visita técnica al sitio para inspección visual con la Secretaría de Seguridad y Justicia de GobAnt para revisión de la situación de seguridad, con el propósito de generar un diagnóstico de las acciones a corto y mediano plazo necesarias a abordar. Se tiene un informe y acta de reunión de la visita.

Es importante, continuar con el seguimiento y evaluación del estado físico y financiero del Central Park, para el tema de obra e interventoría, y de esta manera, lograr claridad en el balance y la pertinencia de las adiciones de acuerdo a lo expuesto por la supervisión de Indeportes, la cual menciona que son requeridas para la continuidad de la interventoría contrato 564 de 2022.



Solicitar a la supervisión el cumplimiento de los soportes y las actividades trazadas y acordadas conjuntamente en el check list, para proceder al reinicio del contrato, dando continuidad y finalización al contrato de obra 553 de 2022 y las actividades pendientes en el marco del mismo.

Realizar seguimiento a la gestión efectuada para el permiso del AMVA para el acceso norte.
Gestionar todas las supervisiones requeridas en cuanto a los procesos de energía y alcantarillado para el inicio de obra.

Es importante revisar la factura allegada por el AMVA, relacionada con la visita y los trámites que se avanzaron para el acceso norte, entendiendo que se dejó la instrucción (por medio de correo electrónico) de revisar los pagos realizados en el transcurso de este proceso y enviar el consolidado de la información al AMVA, para concluir o no la pertinencia de la misma.

(El check list con la herramienta semáforo, se encuentra en el sharepoint y hace parte de los archivos soporte y back up propios, también compartido por medio de correo electrónico oficial de Indeportes Antioquia y del cual tiene conocimiento la supervisión, el apoyo jurídico y el apoyo técnico al proceso; así también como, la Gerencia de Indeportes Antioquia).

Nota: Para mayor detalle e información de este proyecto, revisar el Anexo N°3: Informe ejecutivo resumen del Central Park, anexo al Informe de gestión.


-Proyecto Ciclo-infraestructura Oriente – Convenio 737 de 2017 EMDUCE:
Seguimiento al avance en el proceso de reinicio del proyecto ciclo-infraestructura oriente contrato 737 de 2017, de acuerdo a todos los avances establecidos en el periodo. Pues a la fecha, está pendiente el comité con el IDEA para aprobación del desembolso a EMDUCE (previo aporte de toda la documentación que hace parte del proceso de contratación) y proceder a que EMDUCE de acuerdo con su contrato de mandato, pueda a su vez, realizar el desembolso con el derivado que ejecuta la obra y proceder a levantar la suspensión y dar reinicio a la misma.

Este contrato se encuentra directamente relacionado con el contrato marco del DAGRAN, que ya se encuentra reiniciado y por medio del cual también se aportan recursos para la medida cautelar.
Por medio de las mesas técnicas efectuadas, se generó la instrucción y se llegó a la conclusión y acuerdo por

medio de acta, con todas las partes intervinientes en el proceso, que el inicio de las obras contempla como medida prioritaria abordar lo correspondiente a la medida cautelar y posteriormente, revisar y proceder a dejar uno de los tramos funcionales.

Es importante tener en cuenta la revisión de la ejecución financiera una vez se culmine la ejecución de los puntos relacionados con la medida cautelar, para revisar y trazar el alcance de la ejecución de los tramos. (La supervisión del convenio tiene todo debidamente registrado en las actas de reunión y en el cuadro de los proyectos, se encuentra el link para acceder a la información del proceso).

Nota: Para mayor detalle e información de este proyecto, revisar el Anexo N°4 informe ejecutivo resumen, anexo al informe de gestión.

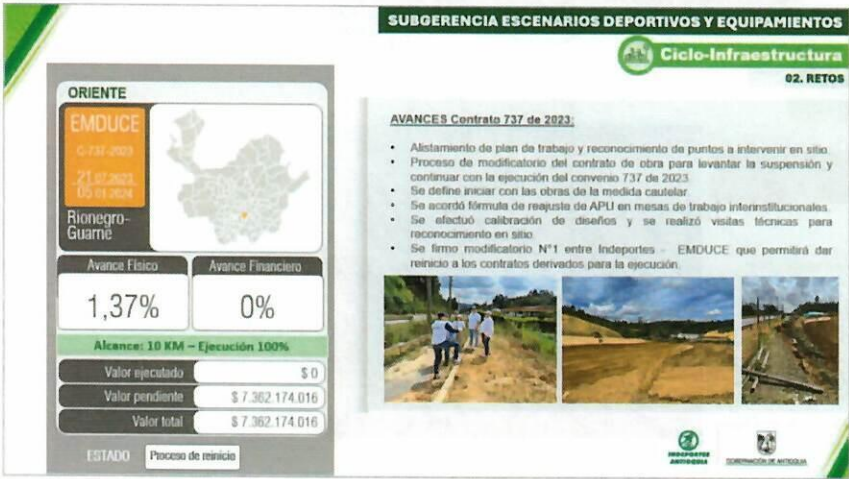

-Proyecto Ciclo-infraestructura Oriente – Convenio 418 de 2019 EDESO:
Desde la Subgerencia, se identificaron las siguientes estrategias y pasos a seguir:

- Como administración entrante, se requiere conocer el estado del Proyecto, razón por la cual se define celebrar un contrato para efectuar el diagnóstico del estado actual de la obra física en lo ejecutado y lo requerido a ejecutar, efectuando un registro completo.
- De acuerdo al resultado del contrato de diagnóstico, se deberá revisar la posibilidad de generar un nuevo convenio para culminar el objeto del contrato inicial y cumplir con los alcances del mismo y de esta manera subsanar las inconsistencias que se presentan.
- A partir del diagnóstico, clasificar las obras que requieren mantenimiento y adecuación.
- Se requiere de un esfuerzo conjunto entre ambas entidades para concluir los compromisos pactados y entregar obras funcionales a la ciudadanía.

Para lo cual, se avanzó en la propuesta del contrato de diagnóstico y se generaron los estudios y diseños para el desarrollo del mismo. Actualmente, está pendiente la revisión jurídica y técnica final para presentar ante el comité de contratación de Indeportes Antioquia y proceder así con la firma y acta de inicio. Desde la Gerencia y la dependencia Jurídica, se define la contratación a EMDUCE por medio de un contrato de mandato para la ejecución de esta actividad.

Se efectuaron diversas reuniones estratégicas y talleres de trabajo tanto técnicos como directivos, donde se realizó ruta de abordaje y frente a la información disponible en los archivos de Indeportes Antioquia y la información y evidencias que procedió EDESO a revisar, consolidar y proporcionar para el cruce de datos y proceder a concluir un cierre financiero y técnico.

Actualmente, la Subgerencia de Escenarios y Equipamientos Deportivos se encuentra en la revisión de la información proporcionada por EDESO.

-Proyecto Ciclo-infraestructura Oriente – Convenio 738 de 2023 con PROMOTORA FERROCARRIL:

Se efectuaron diversas reuniones y talleres de trabajo interdisciplinario e interinstitucional, con el propósito de revisar la información y documentación dispuesta en Indeportes Antioquia y la disponible desde la Promotora Ferrocarril, para proceder al cierre técnico y financiero del convenio.

Toda vez, que se tiene identificado el pago de 3 actas y pendientes las demás actas, las cuales se contrastaron con los entregables que justifican el pago de las mismas.

EJECUTADO CONVENIO 10000676 CICLOINFRAESTRUCTURAS - INDEPORTES ANTIOQUIA									
SEPARADO POR APORTANTES Y RENDIMIENTOS									
N° ENCARGOS FINANCIEROS	DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS	N° CUENTAS	VALOR RECIBIDO	VALOR RESERVADO	DISPONIBLE X COMPROMETER	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONVENIO	LABORES	VR RENDIMIENTOS GENERADOS
10000004220	ACTA 1 APORTES INDEPORTES	10010143	34.507.884.930	33.248.392.745	1.259.552.185	27.102.290.793	7.405.594.137	33.248.332.745	327.240.683
10000004458	COMPRA PREDIOS CICLO OCCI CTO 378	10010908	2.509.531.177	2.029.495.777	480.035.400	1.736.090.380	773.440.797	2.029.495.777	45.033.628
10000004460	COMPRA PREDIOS ORIENTE H CICLO CT	10010910	0	0	0	0	0	0	84.649.992
10000004245	ACTA N 1 APORTES IDEA	10010145	28.407.926.037	28.407.926.037	0	23.204.074.711	5.203.851.326	28.407.926.037	0
10000004462	APORTES IDEA COMPRA PREDIOS ORIENTE	10010912	1.592.073.963	1.045.508.893	546.565.070	746.253.977	845.819.986	1.045.508.893	0
SUBTOTAL APORTES			67.017.416.107	64.731.263.452	2.286.152.655	52.788.709.861	14.228.706.246	64.731.263.452	456.924.303
10000004221	RENDITOS ACTA N 1 APORTES IND	10010146	335.128.012	0	335.128.012	0	335.128.012	0	7.637.880
10000004247	RENDIMIENTOS ACTA N 1 APORTES IDEA	10010144	0	0	0	0	0	0	0
10000004459	REND CTA 10010908	10010146	45.776.939	0	45.776.939	0	45.776.939	0	743.596
10000004461	REND CTA 10010910 PREDIOS OR	10010144	86.213.617	0	86.213.617	0	86.213.617	0	1.563.340
SUBTOTAL RENDIMIENTOS			467.118.568	0	467.118.568	0	467.118.568	0	9.944.816
TOTAL			67.484.534.675	64.731.263.452	2.753.271.223	52.788.709.861	14.695.824.814	64.731.263.452	466.869.119

ACTA DE EJECUCIÓN N°2 - 0071 DE 2019- DERIVADO DEL CONVENIO MARCO N° 057 DE 2017

EJECUTADO CONVENIO 10000712 CICLOINFRAESTRUCTURAS - INDEPORTES ANTIOQUIA

N° ENCARGOS FINANCIEROS	DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS	N° CUENTAS	VALOR RECIBIDO	VALOR RESERVADO	DISPONIBLE X COMPROMETER	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONVENIO	LABORES	VR INTERES GENERADOS
10000004429	APORTE IDEA ACTA 2	10010747	20.000.000.000	19.756.154.018	243.845.982	10.136.739.846	9.863.260.154	19.756.154.018	0
10000004463	APORTES IDEA COMPRA DE PREDIOS ORIENTE	10010913	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0
10000004507	APORTES INDEPORTES ACTA EJEC 2	10011012	6.483.113.329	6.483.113.329	0	143.331.971	6.339.781.358	6.483.113.329	164.185.890
10000004508	RENDI ACTA DE EJECUCION 2 IN	10011013	166.245.026	0	166.245.026	0	166.245.026	0	2.059.136
10000004541	RENDIMTOS IDEA ANTICIPO CTO EDESQ	10011113	22.574.786	0	22.574.786	0	22.574.786	0	0
TOTAL			36.671.933.141	26.239.267.347	10.432.665.794	10.280.071.817	26.391.861.324	26.239.267.347	166.245.026

ACTA DE EJECUCIÓN N°2 - 0071 DE 2019- DERIVADO DEL CONVENIO MARCO N° 057 DE 2017

EJECUTADO CONVENIO 10000712 CICLOINFRAESTRUCTURAS - INDEPORTES ANTIOQUIA

N° ENCARGOS FINANCIEROS	DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS	N° CUENTAS	VALOR RECIBIDO	VALOR RESERVADO	DISPONIBLE X COMPROMETER	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONVENIO	LABORES	VR INTERES GENERADOS
10000004429	APORTE IDEA ACTA 2	10010747	20.000.000.000	19.756.154.018	243.845.982	10.136.739.846	9.863.260.154	19.756.154.018	0
10000004463	APORTES IDEA COMPRA DE PREDIOS ORIENTE	10010913	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0
10000004507	APORTES INDEPORTES ACTA EJEC 2	10011012	6.483.113.329	6.483.113.329	0	0	6.483.113.329	6.483.113.329	164.185.890
TOTAL APORTES			36.483.113.329	26.239.267.347	10.243.845.982	10.136.739.846	26.346.373.483	26.239.267.347	164.185.890
10000004508	RENDI ACTA DE EJECUCION 2 IN	10011013	166.245.026	0	166.245.026	0	166.245.026	0	2.059.136
10000004541	RENDIMTOS IDEA ANTICIPO CTO EDESQ	10011113	22.574.786	0	22.574.786	0	22.574.786	0	0
TOTAL APORTES MAS RENDIMIENTOS			36.671.933.141	26.239.267.347	10.432.665.794	10.136.739.846	26.535.193.295	26.239.267.347	166.245.026

-Acompañamiento técnico para la adecuación y mantenimiento de las sedes:

Se efectuaron visitas técnicas a las sedes: Villa Deportiva, Villa Náutica, Neiva 80, para las cuales se generó un informe técnico del diagnóstico con la identificación de los puntos críticos y/o importantes para abordar en cuanto a adecuación, reparación y mantenimiento.

Se generó un presupuesto detallado, para las sedes: Villa Deportiva y Villa Náutica.

Se tiene pendiente concretar el proyecto de contratación, la cual se realizará con el concurso del Área Jurídica y de la Subgerencia Administrativa; puesto que el indicador además hace parte de esta última.

Es importante revisar los tiempos para la contratación y cumplir con el compromiso de los recursos para la vigencia 2024.

Se tiene como global 2 ítems: eléctrico y estructural que requieren de revisión, cuantificación y presupuesto, pues son áreas con las cuales no se cuenta en la experticia técnica dentro de la entidad. Tener en cuenta que esto puede elevar el presupuesto inicial y deberá contar con este imprevisto u obras extras que se generen.


La propuesta técnica para la contratación se propone por etapas, dado que aún no se cuenta con presupuesto para la Neiva 80 y que deberá intervenir posteriormente.

Nota: Toda la información sobre los informes técnicos y el presupuesto fue enviado por medio de comunicación interna a la Subgerencia Financiera.

-Propuesta Municipio Amagá, a partir de la demolición de la casa de vicio:

Pendiente la revisión técnica para concluir el alcance de la intervención y el aporte de acompañamiento técnico y/o de cofinanciación, para el lote que quedó disponible a partir de la demolición de la casa de vicio en el corazón barrial del municipio, a partir del compromiso gubernamental de generar un espacio deportivo.

Se efectuaron diversas visitas técnicas, se estudió la propuesta y se generó la alerta de la importancia de la contención estructural de las culatas de las fachadas perimetrales que bordean el lote tras la demolición y la necesaria adecuación estructural del suelo inestable, en el área disponible para intervención en el retiro de la quebrada.

 INDEPORTES ANTIOQUIA	ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	F-TH-72	Versión 1
			Aprobación: 17/12/2020

Por parte del supervisor y la profesional que efectuó la visita al sitio, se tiene un informe técnico de diagnóstico y recomendaciones.

-Barrio Fest:

Pendiente de revisar la pertinencia de esta contratación y/o apoyo de co-financiación con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, para el cual se comprometió \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos), a partir de la propuesta de impulso de marca que inicialmente se consideraba de competencia para la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos, pero que una vez, ahondado en el proyecto y alcance de la propuesta, además del programa a desarrollar, deberá evaluar la pertinencia el proceso de contratación y la dependencia que estaría a cargo.

Se generó reunión estratégica de empalme con el Subgerente de Fomento y el Asesor Jurídico y compartió por correo electrónico oficial, la propuesta presentada por el ICPA para su análisis y la toma de decisiones.

-Visitas Técnicas con PEPSICO:

A partir del interés generado por la empresa PEPSICO en los escenarios deportivos del departamento de Antioquia, por medio de su propuesta “Estadios de Barrio” generada a partir de su marca Gatorade, aborda a Indeportes Antioquia para la identificación de escenarios deportivos que requieren adecuación y/o mantenimiento en los municipios del departamento, que puedan aplicar a esta propuesta.

Para lo cual, se generó un listado de 6 municipios para los Gatorade muestra interés y se programan las visitas técnicas con el acompañamiento del equipo de la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos. El tema se abordó directamente con los Alcaldes, comentando el interés de esta empresa externa y aclarando que será determinación de PEPSICO los escenarios a intervenir, para lo cual deberá presentar la propuesta y el Alcalde aprobará o no la misma, aclarando su interés de participar.

En efecto se visitaron escenarios deportivos para adecuación y/o mantenimiento en los municipios de: Amagá, Pueblorrico, Santo Domingo, Granada y se encuentran pendientes las visitas técnicas a los municipios: Támesis y Abriaquí.

Una vez se concluyan las visitas, PEPSICO deberá generar la propuesta y la definición de los escenarios para los que se encuentra interesado ejecutar y se procederá a las mesas técnicas con el equipo directivo de Indeportes y el Alcalde, para proceder o no con la propuesta.

-Convocatoria vigencia 2024:

Con el propósito de llevar a cabo los indicadores de nuestra ruta “POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027”, el 10 de mayo se publican en la página INDEPORTES Antioquia www.indeportesantioquia.gov.co los términos de referencia para acceder a recursos de cofinanciación por medio de la CIRCULAR-2024000016-DEL-10-DE-MAYO-DE-2024, para la convocatoria para adecuación y/o mantenimiento de escenarios deportivos en los municipios y/o distritos del departamento de Antioquia.



La propuesta consistió en presentar 1 proyecto por municipio que tenga las necesidades más apremiantes en materia de infraestructura deportiva, y el 14 de junio, se cerró el plazo de la convocatoria publicada y se contó con la participación de 74 municipios y se radicaron 83 proyectos, dado que algunos municipios presentaron más de 1 proyecto, para lo cual se tiene el siguiente resultado:


El proceso continuó con otras 2 circulares, por medio de las cuales se estableció el cronograma y la etapa de subsanación, finalmente determinando la totalidad de 42 proyectos que, si cumplieron con los términos de referencia establecidos y que continuaban con la etapa de estructuración del proyecto en FASE III, para proceder al proceso de contratación.

Se efectuaron mesas técnicas virtuales con todos los municipios y el equipo interdisciplinario, para socializar la revisión del proyecto en Fase 3 y generar recomendaciones.

Se procedió a articular a los actores y dependencias de Indeportes, para iniciar el proceso de contratación. Para lo cual, los municipios deberán subsanar lo pendiente y cumplir con toda la documentación determinada en el proceso contractual.

Se considera necesario, revisar el proceso de contratación conjunta para el compromiso presupuestal de los recursos en la vigencia 2024, donde deberá evaluarse la generación de un contrato con el IDEA o un contrato con cada municipio con la generación de una cuenta conjunta en el IDEA.


Con el proceso de la convocatoria y la suscripción de los contratos y el compromiso de los recursos, se estima superar la meta propuesta para el año 2024 (8 convenios de mantenimiento suscritos).

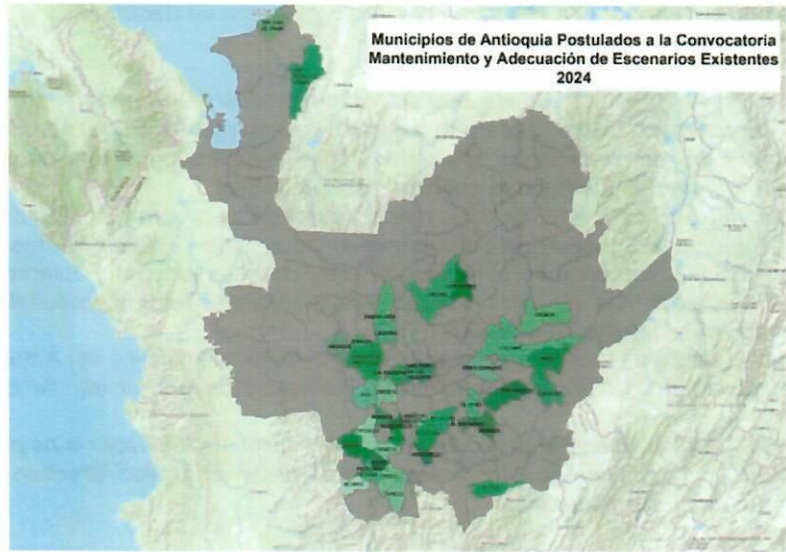

Identificación de los 42 municipios seleccionados que cumplieron con los términos de referencia de la convocatoria.

3. Detalle de los presupuestos, programas, estudios y proyectos.
(Detalle la situación de los recursos de la última vigencia de los presupuestos, programas, estudios y proyectos).

Se recibió como presupuesto para la actual vigencia un valor de \$15.349.298.037, distribuidos de la siguiente manera:

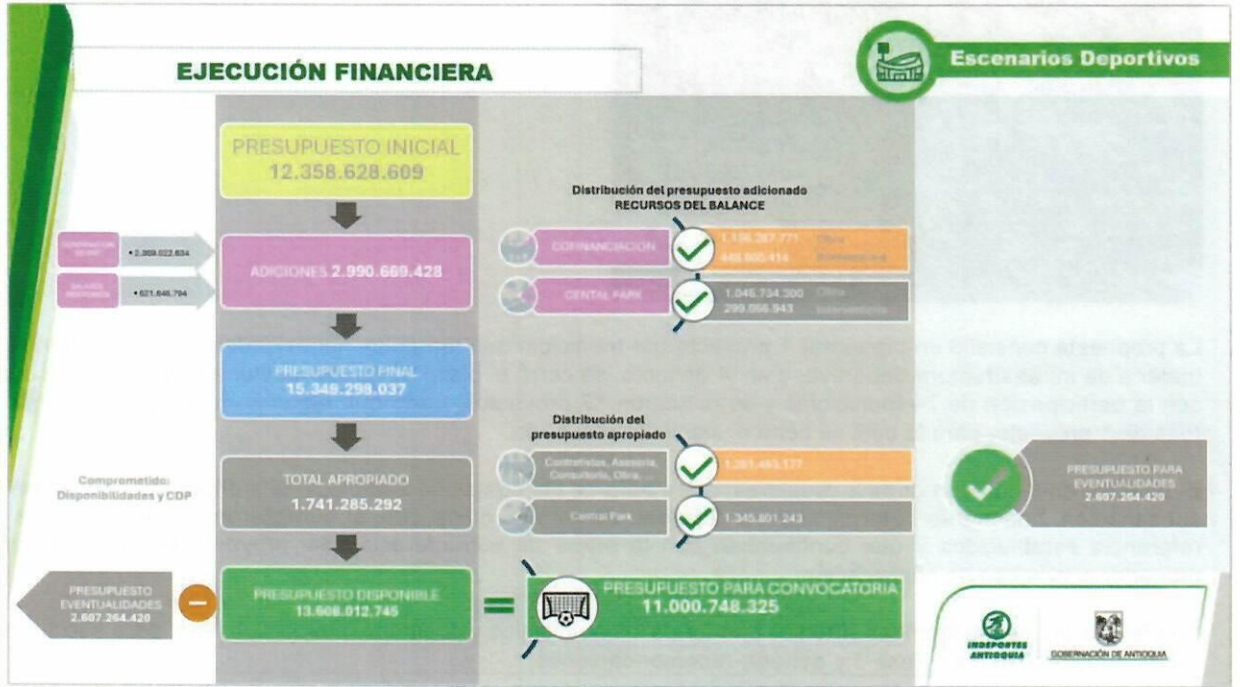

EN RESUMEN PTO SUBGERENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EQUIPAMIENTOS		
DESCRIPCION	VALOR	%
PREPUESTO INICIAL	12.358.628.609	
ADICIONES	2.990.669.428	
PTO ADICIONADO	15.349.298.037	100%
PPTO. DISPONIBLE	13.608.012.745	89%
TOTAL APROPIADO	1.741.285.292	11%



Anteproyecto presupuesto 2025:

Dependencia

Administrat. Altos Logros Comunica. Escenario Fomento y Funcionam. Investigaci3n Planeaci3n Sistemas

Codigo	Proyecto	Dependencia	Proyecto	Requerido	PAA	Contratista	No PAA	Remina
050070	75	Escenarios Deportivos	Mantenimiento, adecuaci3n, mejoras de escenarios deportivos o equipamientos en el departamento de Antioquia	10.289.460.952	9.676.981.862	527.479.090	85.000.000	0
050074	76	Escenarios Deportivos	Construcci3n de escenarios deportivos en el departamento de Antioquia	4.409.768.986	3.690.378.119	634.390.867	85.000.000	0
TOTAL				14.699.229.938	13.367.359.981	1.161.869.957	170.000.000	0

3.1. Relacione la ejecuci3n presupuestal o los rubros especifcos del presupuesto institucional a cargo de su dependencia, a la fecha de entrega de cargo: (adicione tantas filas como necesite)

Se relaciona la ejecuci3n presupuestal con corte al 16 de septiembre de 2024

RUBRO	VALOR	COMPROMETIDO	ORDENES DE PAGO	PAGADO	% DE EJECUCION
4.43.4301.64.0-101024.2.3.2.02.02.008.13.	328.769.351	282.498.384	127.089.083	127.089.083	85,93%
4.43.4301.64.0-202029.2.3.2.02.02.005.01.	823.428.636	823.428.636	762.689.519	762.689.519	100,00%
4.43.4301.64.0-205128.2.3.2.02.02.006.08.	80.190.080	80.190.080	48.114.048	48.114.048	100,00%
4.43.4301.64.0-205128.2.3.2.02.02.008.15.	415.092.692	368.773.547	220.794.388	220.794.388	88,84%
4.43.4302.75.0-101024.2.3.2.02.01.004.06.	16.743.211	0	0	0	0,00%
4.43.4302.75.0-101024.2.3.2.02.02.006.14.	7.372.505	0	0	0	0,00%
4.43.4302.75.0-101024.2.3.2.02.02.008.46.	504.997.002	19.490.730	0	0	3,86%
4.43.4302.75.0-202029.2.3.2.02.02.005.03.	2.329.658.942	0	0	0	0,00%
4.43.4302.75.0-202029.2.3.4.04.	5.680.545.586	0	0	0	0,00%
4.43.4302.75.0-205128.2.3.2.02.02.005.04.	779.688.000	0	0	0	0,00%
4.43.4302.75.0-205128.2.3.2.02.02.006.15.	211.276.462	0	0	0	0,00%
4.43.4302.75.0-205128.2.3.2.02.02.008.48.	1.316.444.785	0	0	0	0,00%
4.43.4302.75.0-205128.2.3.4.04.	1.879.454.305	0	0	0	0,00%
	14.373.661.557	1.574.381.377	1.158.687.038	1.158.687.038	10,95%

3.2. Estado de los proyectos: relacione el estado de avance de cada proyecto: (adicione tantas filas como necesite)

El estado de los proyectos, se encuentra en consignado en el matriz principal de convenios 2020-2023 que hace parte del Sharepoint: INFRA y se encuentra en la carpeta: SUPERVISI3N CONVENIOS.
Se remite el siguiente v3nculo para acceso al archivo:

MATRIZ CONVENIOS 2020-2023 Infraestructura 01.02.2024.xlsx:
<https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:x:/r/sites/EQUIPOTCNICOINFRAESTRUCTURA/Documentos%20compartidos/MATRIZ%20CONVENIOS%20%2020202023%20Infraestructura%2001.02.2024.xlsx?d=w257cc7c3ad1f4bdfb9f927364cd688d0&csf=1&web=1&e=X3Fvek>

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES	SALDO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.3. Metas del Plan de Acción: relacione el nivel de cumplimiento de los programas asignados a su dependencia: *(adicione tantas filas como necesite)*

EJE	PROGRAMA	META CUATRENIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
Línea 2: Cohesión desde lo social	Espacios deportivos incluyentes y seguros: Escenarios deportivos o equipamientos adecuados, mantenidos o mejorados.	80	0%	A la fecha, no se presenta avance del indicador, toda vez que se avanza en el proceso contractual de los proyectos seleccionados por medio de la convocatoria. Una vez, se logren comprometer los recursos se podrá evidenciar el estado de cumplimiento. Para la vigencia 2024 se tiene trazada la meta de 8 convenios de mantenimiento suscritos.
	Espacios deportivos incluyentes y seguros: Infraestructura deportiva construida.	18	0%	A la fecha, no se presenta avance para el indicador de este programa, puesto que está direccionado entre otras cosas, para la construcción de gimnasios al aire libre, los cuales están por definir en su metodología y propuesta de ejecución.

Los indicadores establecidos por la subgerencia para el plan de acción 2024 son los siguientes:

- Número de proyectos Viabilizados:
Este indicador corresponde a los proyectos que se viabilicen en 2024, producto de la convocatoria realizada. A la fecha se registra en cero debido a que aún están proceso de viabilización.
- Número de proyectos terminados:
Este indicador corresponde a los proyectos de la vigencia anterior que no se alcanzaron a terminar a 31 de diciembre de 2023 y que hemos estado ejecutando durante 2024 y terminamos. De 55 proyectos que pasaron de vigencia a la fecha se han terminado 23.
- Número de estudios previos realizados:
Este indicador corresponde a los estudios previos que realice para firmar convenios producto de la convocatoria y otros contratos. A la fecha se ha realizado un estudio previo para contratar el diagnóstico de las obras del contrato 418 de 2019.
- Número de supervisiones realizadas:
Corresponde al número de supervisiones que se vienen realizando. Se inició con 55 las cuales continúan hasta que se liquide, sin embargo, se reportan las supervisiones que continúan de los proyectos en ejecución que a la fecha son 32.
- Número de liquidaciones realizadas:
Corresponde al número de liquidaciones de vigencias anteriores que ha realizado el grupo élite. A la fecha se contabilizan 4.

4. Obras públicas y proyectos en proceso.

- Proyectos 2023 en curso:
A la fecha, la dependencia cuenta con 62 proyectos a cargo, de los cuales se encuentran; 16 convenios suspendidos, 5 en ejecución y 41 terminados (los cuales deberán iniciar proceso de liquidación), de la siguiente manera:



Nº DEL CONVENIO O CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE	CONTRATO-CONVENIO	ESTADO EXPEDIENTE	OBSERVACIONES	POLÍTICAS
		AGILIZAR ESPEROS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO MARIA CECILIA DEL MUNICIPIO DE ARAUZA, ANTIOQUIA		GLORIA CECILIA MONTOYA	IVAN DARIO GRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
723	ASIRACLI	LA IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA LIBRERÍA DEPORTIVA RONALDO TRIJALLO VASQUEZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARAUZA, ANTIOQUIA	30-09-24	GLORIA CECILIA MONTOYA	IVAN DARIO GRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
460	GAHLER	AGILIZAR ESPEROS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ANDELE, ANTIOQUIA	5-mar-24	GLORIA CECILIA MONTOYA	LUZ ADRIANA VALENCIA	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	OK
728	ANDES	LA IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA LIBRERÍA DEPORTIVA ENRIQUE TROYANO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPISCIANOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARIZADO-ANTIOQUIA	30-09-23	LUZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO GRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
901	APARIZADO	Convenio interadministrativo para la ejecución de los obras complementarias del patrimonio del municipio de Arboletes Antioquia	20-09-23	LUZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO GRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
074	ARBOLETES	AGILIZAR ESPEROS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CACHA DE TETICA DE PUTULA, URBANA DEL MUNICIPIO DE BELMAR, ANTIOQUIA	20-09-23	LUZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO GRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
738	BELMAR	AGILIZAR ESPEROS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CACHA DE TETICA DE PUTULA, URBANA DEL MUNICIPIO DE BELMAR, ANTIOQUIA	23-09-24	GLORIA CECILIA MONTOYA	IVAN DARIO GRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
776	BETULIA	AGILIZAR ESPEROS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CACHA DE TETICA DE PUTULA, URBANA DEL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA	6-mar-24	GLORIA CECILIA MONTOYA	IVAN DARIO GRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
316	CAICEDO	Convenio interadministrativo para la construcción de la subestación y la placa polidivisorina en la vereda Bella Aguada, primera etapa en el municipio de Canandé, Antioquia	20-09-23	LUZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO GRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
430	CAICEDO	Convenio interadministrativo para la construcción de la subestación y la placa polidivisorina en la vereda El Triunfo, Municipio de Canandé, Antioquia	6-mar-24	LUZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO GRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
461	CAMPAMENTO	Compartenencia y el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia para cofinanciar la construcción de una placa polidivisorina en la vereda El Reposo en el municipio de Campamento, Antioquia	31-03-23	LUZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO GRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	

714	CARAMANTA	ALINAR ESFUERZOS PARA COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DE BRACERAS PARA LA CARRERA SINTÉTICA DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA	21-dic-21	GLORIA CECILIA MONTON	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
054	CARCOLINA DEL PRÍNCIPE	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CARCOLINA DEL PRÍNCIPE, ANTIOQUIA	25-dic-21	GLORIA CECILIA MONTON	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
079	CHICORDO	Aunar esfuerzos para cofinanciar el mejoramiento de dos (2) escenarios deportivos en el área urbana del municipio de Chicordó Antioquia	9-may-24	LIZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
303	CHINEROS	Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en el mejoramiento y adecuación del camino Jorge Adorno en zona rural, ubicado en la zona 16.802.36 del municipio de Chineros - Antioquia	11-dic-21	GLORIA CECILIA MONTON	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
540	ENVIGADO	OBRAS DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CARRERAS SINTÉTICAS EN EL BARRIO TURISTA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA	30-dic-21	IVAN DARIO BRAJALES Y LIZ ADRIANA VALENCIA		CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
736	FRONTINO	Adecuación de la cancha de fútbol del corregimiento Tullibara del municipio de Frontino	21-nov-24	GLORIA CECILIA MONTON	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
770	GUAPÉ	Aunar esfuerzos para cofinanciar el mejoramiento de la cancha asfáltica de la zona de patios del municipio de Guapé Antioquia	16-dic-21	IVAN DARIO BRAJALES Y LIZ ADRIANA VALENCIA		CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
709	HELICONIA	ALINAR ESFUERZOS PARA COMENZAR EL MEJORAMIENTO DEL COLEGIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA, ANTIOQUIA	20-dic-21	LIZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
410	HISPANIA	ALINAR ESFUERZOS PARA COMENZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA	30-dic-21	LIZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
735	LA PINTADA	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA SINTÉTICA POLIDEPORTIVA COBERTA DEL BARRIO EL CARNELO DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA	30-dic-21	LIZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
225	LA UNIÓN	Convenio interadministrativo de cofinanciación para aunar esfuerzos para la construcción de la Unidad de Vida para Antioquia (UVA) - LA UNIÓN ubicada en la unidad deportiva 19 de diciembre MEJORAMIENTO DE LA CARRERA DE FÚTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE MACEDÓ, ANTIOQUIA	20-nov-24	IVAN DARIO BRAJALES Y LIZ ADRIANA VALENCIA		CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
055	MACEDÓ	Mejoramiento de la plaza polideportiva de la vereda Sabanas en el municipio de Macedó - Antioquia	20-dic-21	GLORIA CECILIA MONTON	LIZ ADRIANA VALENCIA	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	LA POLIZA ESTÁ VENCIDA, SE DEBEN CARGAR LAS PRESENTA PASOS DE RECIBIR
054	MONTIBELLO	Mejoramiento de la infraestructura física del colegio municipal de Mauricio López de Montibello - Antioquia	21-nov-24	GLORIA CECILIA MONTON	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	LA POLIZA ESTÁ VENCIDA, SE DEBEN CARGAR LAS PRESENTA PASOS DE RECIBIR
727	MONTIBELLO	Aunar esfuerzos para cofinanciar la construcción de la cancha de fútbol Guillermo Gaviria Correa del municipio de Claya, Antioquia	31-dic-21	GLORIA CECILIA MONTON	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
085	OLAYA	Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en la construcción de obras complementarias de infraestructura deportiva del Prometo Salsadero al Parque del Municipio de Pailón, Antioquia	21-dic-21	LIZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
325	PUEBLO RICO	ALINAR ESFUERZOS PARA COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO SACCOTE AL PARQUE DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA	11-nov-21	LIZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
731	PUERTO NARE	Mejoramiento y ampliación de redes eléctricas de la Villa Olímpica del Municipio de San Carlos, Antioquia	31-dic-21	LIZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
350	SAN CARLOS	RECUPERACIÓN DEPORTIVOS EN EL CORREGIMIENTO DE EL ESPINO Y LAS VEREDAS DE MARANDITA, POTOSÍ, SAMANGAL Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA	12-dic-21	LIZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
76	SAN CARLOS	Aunar esfuerzos de cofinanciación para realizar el mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura física de la plaza polideportiva barrio obrero del municipio de San Luis Antioquia, barrio de fútbol del municipio de San Rafael, Antioquia	21-mar-24	LIZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
090	SAN LUIS	Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en la construcción del proyecto Salsote al Parque en el Municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia	15-dic-21	GLORIA CECILIA MONTON	LIZ ADRIANA VALENCIA	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
425	SAN RAFAEL	Aunar esfuerzos para cofinanciar el mejoramiento de la cancha de fútbol barrio de Bolívar del municipio de Santa Fe de Antioquia	30-dic-21	LIZ ADRIANA VALENCIA	GLORIA CECILIA MONTON	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
399	SANTA ROSA DE OSOS	Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en la construcción del proyecto Salsote al Parque en el Municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia	30-nov-24	IVAN DARIO BRAJALES Y LIZ ADRIANA VALENCIA		CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	RECIBIR PASOS DE RECIBIR
770	SANTA FE DE ANTIOQUIA	Aunar esfuerzos para cofinanciar el mejoramiento del complejo deportivo RAFAEL MEJIA DEL MUNICIPIO DE TAMESIS, ANTIOQUIA	31-may-24	GLORIA CECILIA MONTON	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
733	TAMESIS	Aunar esfuerzos para cofinanciar la construcción y dotación de plaza polideportiva adobe, sector Cuadrada Larga del municipio de Taro	30-dic-21	LIZ ADRIANA VALENCIA	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
492	TARO	Mejoramiento de la cancha de fútbol y adecuación de las cercas del COMPLEJO MUNICIPAL MANUEL ESCOBAR ARANGO, MUNICIPIO DE VALPARAISO, ANTIOQUIA	14-dic-21	GLORIA CECILIA MONTON	LIZ ADRIANA VALENCIA	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
052	VALPARAISO	ALINAR ESFUERZOS PARA COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO PARA LA PRÁCTICA DE TENIS DE MESA EN EL CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO CULTURAL LOS YOLOMBOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, ANTIOQUIA	25-dic-21	GLORIA CECILIA MONTON	LIZ ADRIANA VALENCIA	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
726	YOLOMBÓ		22-mar-24	GLORIA CECILIA MONTON	IVAN DARIO BRAJALES	CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	
714	ZARAGOZA	ALINAR ESFUERZOS PARA COMENZAR EL MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA	31-dic-21	IVAN DARIO BRAJALES Y GLORIA CECILIA MONTON		CONVENIO	TERMINADO	PENDIENTE LIQUIDAR	Se suspendió a partir del día 20 de diciembre de 2021 y hasta el día 15 de enero de 2024, pero en el tiempo nunca se realizó el rescate o promesa, todo esto aparece suspendido

-Ministerio del Deporte:

Dentro del proceso de cierre documental técnico y financiero con los convenios efectuados con el Ministerio del Deporte y de las visitas técnicas realizadas a cada uno de los escenarios pendientes por recibir; siendo estos: Guadalupe, Santo Domingo, Toledo y Frontino. Se tiene pendiente, acompañar la visita técnica que se programó para la semana comprendida entre el 23 y el 27 de septiembre. Así mismo, está pendiente la ejecución de garantías por parte del contratista para los escenarios de los municipios de: Guadalupe y Santo Domingo.



Escenario Municipio Toledo



Escenario Municipio de Frontino



-Proyecto Parque Metropolitano Tulio Ospina - Central Park:

Actualmente, los siguientes constituyen el contrato en ejecución a la fecha y presenta el siguiente avance físico y financiero:

Contrato en ejecución a la fecha

C-553 / 2022

OBJETO CONTRACTUAL Construcción de las obras requeridas para poner en funcionamiento el parque metropolitano de deportes tulio Ospina del municipio de bello, Antioquia

CONTRATISTA Unión temporal La Alpujarra

C-564 / 2022

OBJETO CONTRACTUAL Interventoría, técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, seguridad en el trabajo y legal a la Construcción de las obras requeridas para poner en funcionamiento el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello, Antioquia.

CONTRATISTA Proeza Ingeniería SAS

AVANCE FÍSICO*
91.32%

AVANCE FINANCIERO*
89.46%

*** CONTRATO ACTUAL: Reportado por la interventoría**

Saldo Ejecutado: \$31.407.304.320,00
as de: 89,58% de ejecución reportado en 11 obras
Saldo pendiente por ejecutar: \$3.660.840.494,96

CONTRATO 553 DE 2022 CONTRATO DE OBRA
Valor total con adiciones: \$35.068.144.815

VALOR CONTRATO 564 DE 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA
Valor total contrato con adiciones: \$3.402.384.209

VALOR CONTRATO ARQUEOLOGÍA 561 DE 2022
Valor total contrato: \$398.507.673

-El 19 de abril: Se procedió a suspender temporalmente la ejecución del Contrato 564 de 2022, hasta el momento en el cual se aprueben los permisos y/o avales de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para lograr culminar las actividades de redes secas y red de alcantarillado y AMVA para el permiso del acceso norte.

-Para el mes de junio: Se cuenta con planos sellados para la conexión a la red de alcantarillado, los cuales fueron enviados al contratista de obra para su revisión y plan de reinicio del contrato Pedido No CRM PED-2823603-N7J5(Hidro 5281306).

Se cuenta con planos sellados para la conexión a la red de acueducto, los cuales fueron enviados al contratista de obra para su revisión y plan de reinicio del contrato Pedido No CRM PED-2823603-N7J5(Hidro 5281305) Radicado en trámite del acceso Norte, en ajustes por solicitud del área Metropolitana y se estaba a la espera respuesta del mismo para la primera semana del mes de octubre.

Avances para la vigencia 2024

Programado 2023



Avance ejecutado 2024

- Proceso constructivo de la barrera tipo 4 al frente de la zona de pits.
- Variado de anillos para pozos sedimentadores.
- Instalación de circuitos en el edificio de torre de control y cableado de redes de media y baja tensión.
- Pre constructivos de la bota superior del sedimentador al igual que la construcción del sistema de bombas.
- Se realiza instalación del cableado externo de iluminación de senderos.
- Se empieza con la entrega de pisos del edificio de torre de control.
- Instalación de todas las redes externas, alimentación a guarnites y funcionamiento de las mismas y los transformadores.

¿Qué falta de acuerdo al diseño inicial?



- Cercamiento Perimetral.
- Vías de Servicio de acceso y de salida.
- Ubicación de puentes de acceso.
- Construcción de plaza acceso.
- Instalación de paisajismo interno.
- Obras blancas tribuna Norte y Sur.
- Instalación de redes de sistemas de emergencia.
- Conexión planta sedimentadores.
- Área de bottega.
- Zona de parguadero.
- Puente de acceso desde la vista es bella hasta la zona de pits.
- Puente de acceso desde la estación del metro hasta la plaza acceso norte y sur.
- Ciclocaminabilidad con su urbanismo.
- Instalación de unidades sanitarias en Piedboca Y CAFETERIAS.

Desde el Plan de desarrollo departamental 2024-2027: "POR ANTIOQUIA FIRME", se determina un apartado especial que considera la vinculación de capital privado para cumplir con el fin último del Parque Metropolitano de Deportes a Motor: Central Park.

ESTADO

Por reiniciar y
prorrogar

Se surtió la etapa de los permisos de conexión eléctrica e hidrosanitaria, se inician las gestiones para el reinicio y se solicita a la Interventoría la información necesaria y suficiente para la ejecución de las obras faltantes. Se está a la espera de la conclusión del trámite con AMVA.
Se ha avanzado en mesas técnicas para resolver pendientes para el reinicio.

-Proyecto Ciclo-infraestructura Oriente – Convenio 737 de 2017 EMDUCE:

Se encuentra pendiente de reinicio del proyecto ciclo-infraestructura oriente contrato 737 de 2017, de acuerdo a todos los avances establecidos en el periodo. A la fecha, está pendiente programar el comité con el IDEA para aprobación del desembolso a EMDUCE (previo aporte de toda la documentación que hace parte del proceso de contratación) y proceder a que EMDUCE de acuerdo con su contrato de mandato, pueda a su vez, realizar el desembolso con el derivado que ejecuta la obra y proceder a levantar la suspensión y dar reinicio a la misma.

El inicio de las obras contempla como medida prioritaria abordar lo correspondiente a la medida cautelar y posteriormente, revisar y proceder a dejar uno de los tramos funcionales.

-Proyecto Ciclo-infraestructura Oriente – Convenio 418 de 2019 EDESO:

Se avanzó en la propuesta del contrato de diagnóstico y se generaron los estudios y diseños para el desarrollo del mismo. Actualmente, está pendiente la revisión jurídica y técnica final para presentar ante el comité de contratación de Indeportes Antioquia y proceder así con la firma y acta de inicio. Desde la Gerencia y la dependencia Jurídica, se define la contratación a EMDUCE por medio de un contrato de mandato para la ejecución de esta actividad.

Se efectuaron diversas reuniones estratégicas y talleres de trabajo tanto técnicos como directivos, donde se realizó ruta de abordaje y frente a la información disponible en los archivos de Indeportes Antioquia y la información y evidencias que procedió EDESO a revisar, consolidar y proporcionar para el cruce de datos y proceder a concluir un cierre financiero y técnico.

Actualmente, la Subgerencia de Escenarios y Equipamientos Deportivos se encuentra en la revisión de la información proporcionada por EDESO.

-Proyecto Ciclo-infraestructura Oriente – Convenio 738 de 2023 con PROMOTORA FERROCARRIL:

Pendiente revisión de la propuesta de liquidación enviada por parte de la Promotora Ferrocarril que contiene las pretensiones financieras y de cierre técnico. A partir de las mesas y talleres generados para la revisión de los entregables y las evidencias para el pago de las actas pendientes.

-Predios Ciclo-infraestructura Oriente y Occidente:

Debe revisarse el avance en la compra de predios, para lo cual, se han venido efectuando mesas y talleres de revisión de cada uno de los predios con la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, y se avanzó en la realización de comité técnico con el IDEA (dado que los recursos se encuentran allí), donde se aprobó el desembolso para el pago final de varios de los predios, los cuales estaban debidamente revisados y con la documentación gestionada por cada uno de los supervisores.

-Convocatoria vigencia 2024:

Con el propósito de llevar a cabo los indicadores de nuestra ruta "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027", el 10 de mayo se publican en la página INDEPORTES Antioquia www.indeportesantioquia.gov.co los términos de referencia para acceder a recursos de cofinanciación por medio de la CIRCULAR-2024000016-DEL-10-DE-MAYO-DE-2024, para la convocatoria para adecuación y/o mantenimiento de escenarios deportivos en los municipios y/o distritos del departamento de Antioquia.

El 14 de junio, se cerró el plazo de la convocatoria publicada por medio de la circular 2024000016 del 10/05/2024, con los términos de referencia para acceder a la convocatoria para adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos.

La propuesta consistía en presentar 1 proyecto por municipio que tenga las necesidades más apremiantes en materia de infraestructura deportiva.

Se presentaron 74 municipios con 83 propuestas, el proceso se determinó por medio de 3 circulares, donde se estimó el cronograma y los términos de referencia de selección, con 1 oportunidad de subsanación de propuestas.

42

Municipios seleccionados para acceder a cofinanciación:

\$10.736.339.288

Costo aproximado de cofinanciación por parte de INDEPORTES

1

2

3



Municipios seleccionados:
Salgar, Sabaneta, Hispania, Sabanalarga, Montebello, Rionegro, Santa Bárbara, Yarumal, El Peñol, El Retiro, Angelópolis, Anzá, Argelia, Campamento, Envigado, Abriaquí, Amagá, El Santuario, Granada, Jericó, Pueblorrico, San Jerónimo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Rafael, Santafe de Antioquia, Santo Domingo, Támesis, Valparaiso, Vegachi, Venecia, Yolombó, Tarso, San Pedro de los Milagros, Caracolí, Maceo, Ebéjico, Liborina, Concordia, Armenia, Mantequilla, Betania, Giraldo.

Para la última etapa del proceso, se solicitó la estructuración del proyecto a Fase 3, actualmente en revisión de las propuestas, para proceder a mesas de trabajo conjuntas para ajustes necesarios y continuar al proceso de contratación. Se procedió a articular a los actores y dependencias de Indeportes, para iniciar el proceso de contratación. Para lo cual, los municipios deberán subsanar lo pendiente y cumplir con toda la documentación determinada en el proceso contractual. Actualmente, se avanza en el proceso de gestión para lograr la suscripción de los convenios.

5. Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos

Los reglamentos y procedimientos son los estipulados por Ley, los manuales los definidos por la entidad para los cuales se solicitó siempre especial atención para: Manual de Supervisión, Manual de Contratación, Manual de Calidad y todos los relacionados con el correcto ejercicio de las funciones en el marco de gestión de calidad de la entidad y los procedimientos definidos por medio de las Circulares emitidas por Indeportes Antioquia a través de la Dependencia Jurídica.

6. Relacione los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente.

Durante el desempeño de mi cargo, se identifica que los riesgos de gestión están condicionados por los siguientes hallazgos:

3.1 Hallazgo por parte de la Contraloría General de Antioquia, generados mediante en el proceso Actuación Especial de Fiscalización AEF 004 de 2024 realizada a Indeportes Antioquia vigencia 2024. Pues deja en firme la Observación Administrativa N°01- Presunta vulneración en el cumplimiento de los fines y principios de la contratación estatal, especialmente en la planeación del contrato 553 de 2022. (A), a través del informe definitivo con radicado R 202402004958 y con fecha 1/07/2024, que determinó lo siguiente: *"la Contraloría General de Antioquia mantiene la observación administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria, por una presunta vulneración al principio de planeación en el contrato 553 de 2022, dado que el parque de deportes a motor Tulio Ospina de Bello, Antioquia, no cumple con la funcionalidad esperada"* y determinó como resumen de los hallazgos, que en el desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización se estableció 01 hallazgo administrativos, con incidencia fiscal y disciplinaria, como se relacionan a continuación:

Tipo de Hallazgo	Cantidad	Valor en pesos
1. Administrativos (total)	01	
Incidencias		
1. Disciplinarios	01	
2. Penales		
3. Fiscales	01	\$27.999.784.925
4. Sancionatorios	-	

Fuente: Carpetas contractuales, recorridos de campo.
Elaboró: Iván Darío Alviar Pérez, PU

Para el cual se efectuó un Plan de Mejoramiento y fue publicado en la plataforma gestión transparente de acuerdo a los requisitos de Ley y lo indicado en el informe de la Contraloría.

Recomendación:
-Es de especial atención, llevar a cabo las acciones que requieren implementarse y dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Mejoramiento. Llevando un adecuado control de los procesos y las evidencias de los mismos, para minimizar los riesgos y cumplir con el objetivo trazado.

(El informe del plan de mejoramiento reposa en el back up entregado y registrado en el sharepoint en la carpeta AUTODROMO, también fue enviado a Control Interno en el plazo estimado -quien efectuó la publicación- y fue compartido con la dependencia Jurídica y Subgerencia Financiera, se tiene trazabilidad por medio de los correos electrónicos oficiales de Indeportes Antioquia).

-Es importante revisar y llevar la trazabilidad de todos los requerimientos y/o denuncias que recibe el proyecto por parte de la ciudadanía, entes de control, veedurías y la Asamblea Departamental de Antioquia, entre otros y deberá ser responsabilidad de la supervisión efectuar el debido seguimiento y respaldo de la información.

3.2 Hallazgos efectuados por la Contraloría General de Antioquia en el proceso de auditoría a Indeportes Antioquia, para lo cual se identificaron 23 casos para la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos y se dejaron en firme 22 y fue requerida la implementación de un Plan de Mejoramiento para toda la entidad el cual fue elaborado y revisado conjuntamente con el Jefe Jurídico y el Subgerente Financiero en coordinación de los proyectos y los compromisos necesarios para minimizar los riesgos a los hallazgos realizados.

Recomendación:
Se requiere efectuar seguimiento e implementación para el cumplimiento de los compromisos y los objetivos trazados. Además de registrar las evidencias y las actividades que se requieren llevar a cabo.
(El informe del plan de mejoramiento reposa en el back up entregado y registrado en el sharepoint en la carpeta AUTODROMO, también fue enviado a Control Interno en el plazo estimado -quien efectuó la publicación- y fue compartido con la dependencia Jurídica, se tiene trazabilidad por medio de los correos electrónicos oficiales de Indeportes Antioquia).

3.3 Hallazgos efectuados en el marco de Auditoría Interna, por parte de Control Interno para el proyecto Central Park y donde se había dado inicio al proceso para todos los proyectos de la Subgerencia Escenarios Deportivos y Equipamientos en el mes de septiembre (auditoría en curso).

10.5. Plan de Mejoramiento			
Número de la acción	Descripción de las no conformidades, observaciones, riesgos, recomendaciones y oportunidades de mejora (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
1-CGA	Presunta vulneración en el cumplimiento de los fines y principios de la contratación estatal, especialmente en la planeación del contrato 553 de 2022. (A) (D) (F)	Se encuentra en evaluación por parte de la Contraloría General de Antioquia	


Para lo cual se solicitó la determinación de un Plan de Mejoramiento, el cual fue elaborado y enviado por correo electrónico oficial de la entidad en el plazo establecido a Control Interno, con copia a la Oficina Jurídica.

Recomendación:
Es importante identificar las conclusiones efectuadas por Control Interno para el proceso de planeación y gestión y proceder a la implementación de los Planes de Acción y los Planes de Mejoramiento establecidos, para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el marco del cumplimiento del Ley; para lo cual, deberá generarse acciones de mejora en el manejo y disposición de la información por parte de la supervisión.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta los procesos de controversias contractuales que está relacionados con el proyecto Central Park, para proceder a gestionar las respuestas y trazabilidad a los requerimientos que surjan.

Controversias contractuales para el Proyecto Central Park:

RADICADO PROCESO	ASUNTO	MEDIDA DE CONTROL	DEMANDANTE	DEMANDA	CUANTÍA
05001333300320230 036000	Contrato Interadministrativo número 505 de 2019	Controversias contractuales	VIVA	INDEPORTES ANTIOQUIA	\$368.419.444
05001233300020230 080100	Contrato Interadministrativo número 265 de 2019	Controversias contractuales	VIVA	INDEPORTES ANTIOQUIA	\$9.617.481.012
05001333303120220 037000	Contrato Interadministrativo número 265 de 2019	Conciliación	VIVA	INDEPORTES ANTIOQUIA	\$19.816.676
05001333301520240 002000	Contrato 443 de 2019	Controversias contractuales	COLEGIO MAYOR	INDEPORTES ANTIOQUIA	\$225.378.834
05001233300020230 057400	Contrato 450 de 2019 y 265 de 2019	Controversias contractuales	INGECON	VIVA E INDEPORTES ANTIOQUIA* *como litisconsorte necesario	\$29.142.242.460

 INDEPORTES ANTIOQUIA	ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	F-TH-72	Versión 1
			Aprobación: 17/12/2020


<p>-<u>Controversias contractuales generales proyectos Subgerencia Escenarios:</u> Se encuentran abordadas por una dupla del equipo de Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos conformada por un profesional técnico y un profesional financiero y una profesional por parte de la Dependencia Jurídica. A partir de la auditoría de por parte de la Contraloría General de Antioquia, se identifican las siguientes:</p> <p>-<u>Convenio 355 de 2017:</u> Escenario de Copacabana: Mediante la Resolución N° S2024000284 del 22 de marzo de 2024, modificada parcialmente por la Resolución S 2024000619 del 3 de julio de 2024, INDEPORTES ANTIOQUIA declaró la ocurrencia de un siniestro de obra y se hace efectiva la póliza de estabilidad y calidad de obra, dentro del contrato N° 355 de 2017, liquidando los perjuicios en la suma de \$428.165.653. Dichos actos administrativos se encuentran en firme. Y se falló a favor de Indeportes Antioquia.</p> <p>- <u>Convenio 214 de 2018:</u> En relación con el convenio 214 de 2018 suscrito con el Municipio de Frontino se adelantó el proceso judicial de controversias contractuales, con radicado 0500133330152022002800, el cual cuenta con sentencia No. 36 del 19 de diciembre de 2023, que declara probada de oficio la caducidad del medio de control. Además, mediante memorando 202401000764 del 1 de febrero de 2024 y se ha solicitado actualizar el plan de mejoramiento.</p> <p>- <u>Convenio 403 de 2019:</u> INDEPORTES ANTIOQUIA se encuentra adelantando el proceso judicial de controversias contractuales con radicado 05001333300120220046200, con el fin de obtener la liquidación judicial del convenio.</p> <p>-<u>Convenio 450 de 2019:</u> INDEPORTES ANTIOQUIA adelantó el proceso judicial de controversias contractuales, que se identifica con el radicado 05001233300020220122700, tendiente a obtener la liquidación judicial del convenio.</p> <p>-<u>Convenio 412 de 2019 – Cisneros:</u> Se encuentra en proceso judicial con radicado 05001333301920220047900, para la liquidación judicial del convenio y el reintegro de la suma de \$17.448.813.35. Cabe mencionar que, el 12/07/2023 se contestó demanda, efectuada por parte del Municipio.</p> <p>-<u>Convenio 419 de 2019 - Jericó:</u> Se encuentra en proceso judicial con radicado 05001233300020220097800, el 27 de mayo de 2024 entró el proceso para fallo.</p> <p>-<u>Convenio 450 de 2019 – Giraldo:</u> Se encuentra en proceso judicial con radicado 05001233300020220122700, donde se está solicitando la liquidación judicial y el reintegro de \$812.022.000. Lo cual se puede verificar por medio del Auto del siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) que no repone auto y concede apelación.</p> <p>-<u>Convenio 403 de 2019 - Entererríos:</u> Se encuentra en proceso judicial con radicado 05001333300120220046200, se está solicitando la liquidación judicial del convenio y el reintegro de la suma \$421.564.035. Lo cual se puede verificar por medio del Auto del 15/03/2024 que fija fecha de audiencia de pruebas para el 10/04/2024.</p> <p>-<u>Convenio 419 de 2019:</u> Se encuentra en proceso judicial con radicado 05001233300020220097800, el 27 de mayo de 2024 entró el proceso para fallo.</p> <p>-<u>Convenio 192 de 2018:</u> Se adelanta el proceso judicial de controversias contractuales con radicado 05837-33-33-004-2023-00582-00 contra el Municipio de Turbo, donde se solicita la liquidación judicial.</p> <p>-<u>Convenio 186 de 2018:</u> Se encuentra en proceso judicial de controversias contractuales con radicado 05001233300020220091800.</p> <p>-<u>Convenio 393 de 2019:</u> Se adelanta el proceso judicial de controversias contractuales con radicado 05001333301120220045500.</p>
--

<p>7. Describa las actividades emprendidas y resultados obtenidos durante la misma, señalando especialmente los asuntos que se encuentran en proceso, y por último la situación del Despacho en la fecha de retiro o término de su gestión.</p>

<p>A continuación, los grandes hitos de los resultados obtenidos durante la gestión y las acciones emprendidas en el ejercicio de mis funciones como Subgerente de Escenarios Deportivos y Equipamientos, para el periodo comprendido entre el 1ro de abril del 2024 y el 20 de septiembre de 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> INDEPORTES ANTIOQUIA suscribió 56 convenios de cofinanciación para la vigencia 2023, de los cuales se han verificado y avanzado de la siguiente manera: Ejecutados en un 100%: Se llegó a un total de 38 escenarios finalizados. Ejecutados entre un 90% y 99%: Se llegó a 2 escenarios pendientes por finalizar. Ejecutados entre un 80% y 89%: 2 escenarios. Ejecutados entre un 70% y 79%: 2 escenarios. En total se logró llegar a 44 escenarios en proceso de cierre. Y se identificaron 12 escenarios con dificultades en la ejecución. Se logra la liquidación de un Contrato N°171 por \$44.000 millones de pesos, recursos provenientes de

INVIAS, venta ISAGEN y el reintegro de \$6 millones de recurso no ejecutado.



- De la vigencia 2020, le logra el cierre del Contrato N°484 se cuenta con el acta de liquidación publicada y con el reintegro de recursos el 22 de marzo por valor de \$ 29,512,240.
- Se logra enviar convocatoria de liquidación bilateral a 4 municipios logrando la firma de tres actas de liquidación y solo un municipio desiste de firmar lo cual conduce a INDEPORTES ANTIOQUIA a interponer una controversia contractual. **Adicionalmente se logra la liquidación de un Contrato N°171 por \$44.000 millones de pesos, recursos provenientes de INVIAS, venta ISAGEN.** (falta ajustar tema predial).
- Se logra proyectar convocatoria y acta de liquidación con municipio de Campamento, lo que suma avance a 5 municipios en proceso de firma de actas de liquidación. Se proyectaron las actas de Ebéjico y el Peñol, pendiente de revisión jurídica y financiera.
- Se logra la liquidación unilateral de los contratos N° 363 y 364 de 2017 por generar mesa de conciliación y de los contratos N° 443 y 444 de 2019, del 444 ya se hizo mesa técnica de conciliación. Estos se suscribieron con el COLMAYOR. Se continúa el avance en el Comité de Controversias Contractuales y a la espera de las resoluciones jurídicas.
- Con la información enviada, el Ministerio validó el capital a reintegrar. Por lo tanto INDEPORTES procede a realizar propuesta de devolución de rendimientos financieros. (\$426 millones aprox reintegro y \$65 millones aprox rendimientos, total= \$491 millones aprox). Se efectuaron las visitas e informes técnicos para el cierre técnico de los proyectos especiales para los escenarios: Guadalupe, Santo Domingo, Toledo y Frontino.
- Se desarrolló una metodología y propuesta para el proceso de convocatoria para acceder a recursos de cofinanciación en materia de adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos para los municipios y/o distritos del departamento de Antioquia.
- Se avanzó en las diferentes instancias del proceso de convocatoria, siendo la última el apoyo y acompañamiento a los 42 municipios que cumplieron con los términos de referencia en la estructuración del Proyecto en FASE III, actualmente de acuerdo a las mesas técnicas virtuales realizadas con cada municipio (para las que se tiene grabación de la reunión y acta de revisión por cada uno de los componentes), se requiere del compromiso de los municipios para la subsanación de los pendientes y el cumplimiento de la documentación contractual definida por Indeportes Antioquia, para iniciar el proceso de suscripción de los convenios.
- Para el tema de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias y felicitaciones: Una vez me incorporé en funciones ya se tenían los siguientes datos: 20 PQRSDF del año 2023 vencidas y 8 PQRSDF del año 2024 vencidas. Ante lo cual, durante mi gestión se logró dar respuesta a 17 PQRSDF del año 2023 y 4 PQRSDF del año 2024 que se encontraban vencidas.
- Se avanzó en el diagnóstico y definición del presupuesto para la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes Villa Deportiva, Villa Náutica, y se tiene un informe técnico de Neiva 80.
- Personal actual que conforma la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos:




Nota: En el Anexo N°1: memoria ejecutiva anexa al informe de gestión se encuentra la definición específica de las actividades que realiza cada integrante del equipo, el cargo que ocupa y la situación del despacho.

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se recomienda un análisis detallado del alcance y las metas que se quieren fijar para la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos, en el marco del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027: "POR ANTIOQUIA FIRME" y en consecuencia del proceso de re-estructuración de la entidad. Adicionalmente, fortalecer el equipo técnico de acuerdo a esta ruta trazada.

Firma: 	Firma: 
Nombre: Isabel Aras Zuluaga	Nombre: Luis Fdo Bego Trujillo
Cargo: Subgerente Escenarios D	Cargo: Gerente Indepor Antioquia
Entrega	Recibe

Firma: 
Nombre: Claudia P Velez Escobar
JEFE DE TALENTO HUMANO

